





ZAC CASSINE


CHIFFRAGE AVP PAR SOUS-SECTEUR AVEC IDENTIFICATION DES MONTANTS DES OPTIONS HORS ZAC

Secteur AVP2023	Sous- secteur AVP2023	Lot 1 H.T. (VRD)	Lot 2 H.T. (Espaces Verts)	Lot 3 H.T. (Equipement - Moblier)	Lot 4 H.T. (Eclairage - Câblage)	Lot 5 H.T. (VRU)	TOTAL H.T. HORS OPTIONS	OPTIONS HORS ZAC H.T.	TOTAL H.T. AVEC OPTIONS HORS ZAC
Place Cassine	A	96 375 €	30 493 €	40 600 €	8 887 €	0 €	176 355 €		176 355 €
Parc Cassine	A	136 479 €	154 437 €	45 343 €	19 319 €	0 €	355 579 €		355 579 €
Cours diagonal	A	1 680 176 €	209 955 €	81 308 €	173 406 €	0 €	2 144 845 €	69 042 €	2 213 888 €
Zone humide	B	194 653 €	185 425 €	5 432 €	0 €	0 €	385 510 €		385 510 €
Cours diagonal	C	1 815 055 €	278 154 €	49 860 €	100 461 €	0 €	2 243 530 €	80 543 €	2 324 074 €
Place Dr Vernier	C	246 717 €	116 508 €	12 566 €	16 580 €	0 €	392 371 €		392 371 €
Parc Cassine	D	998 942 €	632 461 €	393 954 €	55 686 €	0 €	2 081 043 €		2 081 043 €
Reclus P+M	E	1 399 630 €	15 179 €	97 150 €	148 082 €	0 €	1 660 040 €	89 616 €	1 749 656 €
Gare routière	E	953 456 €	37 873 €	161 298 €	14 567 €	0 €	1 167 194 €	2 204 200 €	3 371 394 €
Chemin Cassine	F	1 717 584 €	187 694 €	56 897 €	97 594 €	0 €	2 059 769 €		2 059 769 €
Esplanade	G	117 991 €	96 717 €	6 180 €	49 255 €	0 €	270 143 €		270 143 €
Dr Vernier	G	1 444 508 €	147 033 €	57 577 €	73 090 €	0 €	1 722 208 €		1 722 208 €
Rotonde	H	1 472 349 €	83 105 €	8 693 €	145 060 €	0 €	1 709 208 €	57 457 €	1 766 665 €
VRU	H	893 313 €	52 314 €	0 €	90 841 €	132 000 €	1 168 468 €		1 168 468 €
Initial Rentokil	I	1 724 501 €	38 905 €	34 505 €	85 225 €	0 €	1 883 135 €	69 232 €	1 952 367 €
Place Boisse	I	606 202 €	124 836 €	87 729 €	42 642 €	0 €	861 409 €		861 409 €
VRU	J	343 875 €	136 852 €	0 €	72 253 €	132 000 €	684 980 €		684 980 €
Avenue Pellerin	J	627 881 €	14 450 €	7 993 €	88 550 €	0 €	738 874 €		738 874 €
Rotonde	K	1 132 582 €	166 554 €	6 139 €	80 673 €	0 €	1 385 947 €	59 599 €	1 445 547 €
Place Rotonde	K	321 112 €	120 686 €	33 084 €	37 353 €	0 €	512 235 €		512 235 €
Chantemerle	L	590 428 €	0 €	11 330 €	5 686 €	0 €	607 443 €		607 443 €
TOTAL H.T.		18 513 808 €	2 829 633 €	1 197 639 €	1 405 210 €	264 000 €	24 210 289 €	2 629 690 €	26 839 979 €

Annexe 2 – Clés de répartition de l'AVP global de la ZAC

ZAC CASSINE

IDENTIFICATION DES SECTEURS COMMUNAUTAIRES ET NON COMMUNAUTAIRES

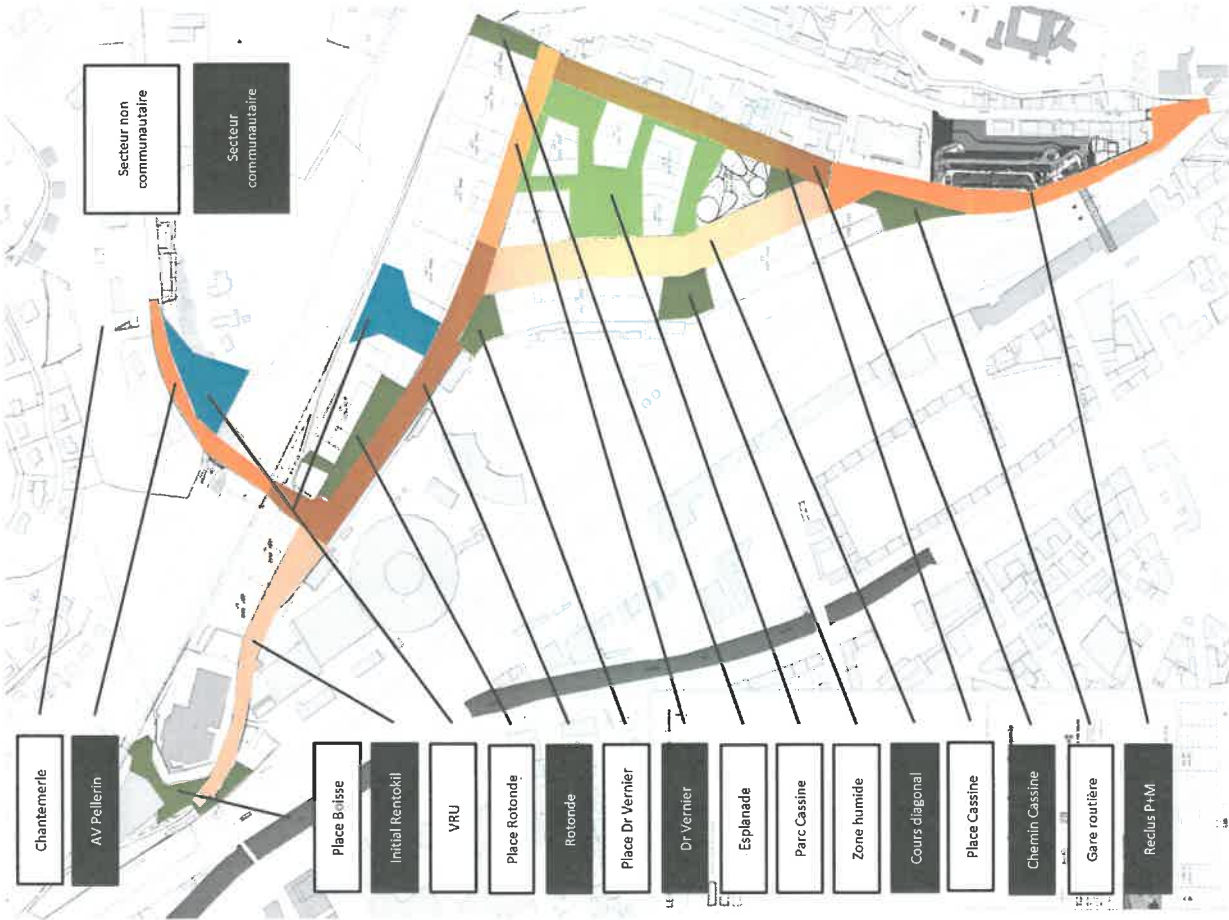

Secteur AVP2023	Sous-secteur AVP2023
Avenue Pellerin	J
Chantemerle	L
Chemin Cassine	F
Cours diagonal	A
Dr Vernier	C
Esplanade	G
Gare routière	E
Initial Rentokil	I
Parc Cassine	A
Place Boisse	D
Place Cassine	I
Place Dr Vernier	A
Place Rotonde	C
Reclus P+M	K
Rotonde	E
VRU	K
Zone humide	J
	B

SECTEUR AVP2023	TOTAL H.T. HORS OPTIONS
Avenue Pellerin	738 874 €
Chantemerle	607 443 €
Chemin Cassine	2 059 769 €
Cours diagonal	4 388 376 €
Dr Vernier	1 722 208 €
Esplanade	270 143 €
Gare routière	1 167 194 €
Initial Rentokil	1 883 135 €
Parc Cassine	2 436 622 €
Place Boisse	861 409 €
Place Cassine	176 355 €
Place Dr Vernier	392 371 €
Place Rotonde	512 235 €
Reclus P+M	1 660 040 €
Rotonde	3 095 156 €
VRU	1 853 448 €
Zone humide	395 510 €
Total H.T. AVP2023	24 210 289 €

OPTIONS HORS ZAC	TOTAL H.T.
Couverture	2 204 200 €
Mise en séparatif Recl.	425 490 €
Total H.T. options	2 629 690 €

ZAC CASSINE

HYPOTHESES DE PARTICIPATIONS HORS RESEAUX EU-AEP-EP

SECTEUR COMMUNAUTAIRE									
	Chaussée	Trottoirs	Cycles	Enedis, Orange	Espaces verts	Mobilier	SLT (équipements)	Eclairage chaussée (équipements)	Eclairage autres (équipements)
Aménageur	50%	75%	50%	100%	75%	75%	50%	50%	75%
Agglo	50% à répartir entre ville-agglo	25% à répartir entre ville-agglo	50%		25%	25% à répartir entre ville-agglo	50% à répartir entre ville-agglo	50% à répartir entre ville-agglo	25% à répartir entre ville-agglo
Ville									
SECTEUR NON COMMUNAUTAIRE									
	Chaussée	Trottoirs	Enedis, Orange	Espaces verts	Mobilier	Eclairage chaussée	Eclairage autres		
Aménageur	75%	75%	100%	75%	75%	75%	75%		
Agglo									
Ville	25%	25%		25%	25%	25%	25%		
SECTEURS SPECIFIQUES									
	VRU	ZONE HUMIDE (mesures compensatoires)	CHANTEMERLE (Incidences de surface des viabilisations - dévolements de réseaux)	GARE ROUTIERE					
Aménageur	75%	100%	100%	Montant de la participation plafonné au montant calculé en 2019 sur le secteur équivalent					
Agglo	12,5%			A définir					
Ville	12,5%								

ZAC CASSINE

MONTANT DES PARTICIPATIONS HORS RESEAUX EU-AEP-EP

Secteur communautaire (hors AEP-EU-EP)	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.	Reste à charge autres collectivités H.T.	Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.	Participation Grand Chambéry - cycles H.T.	Participation ville de Chambéry H.T.
Reclus P-M	1 474 439 €	64,2%	527 598 €	14,6%	0,4%	20,8%
Chemin Cassine	1 518 085 €	70,2%	452 598 €	11,8%	0,3%	17,7%
Dr Vernier	1 470 505 €	70,9%	427 893 €	12,0%	0,3%	16,8%
Cours diagonal	3 465 226 €	71,1%	1 000 342 €	10,2%	1,8%	16,9%
Rotonde	2 488 736 €	67,1%	817 685 €	13,3%	2,6%	17,0%
Initial Rentokil	1 315 612 €	60,7%	516 563 €	17,9%	1,0%	20,4%
Av Pellerin	660 370 €	59,1%	270 323 €	19,0%	- €	21,9%
TOTAL H.T.	12 392 972 €	67,6%	4 013 001 €	13,0%	152 265 €	18,1%
				14,3%	1 767 489 €	

Secteur non communautaire (hors AEP-EU-EP)	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.	Reste à charge autres collectivités H.T.	Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.	Participation Grand Chambéry - cycles H.T.	Participation ville de Chambéry H.T.
Gare routière	1 101 972 €	34,3%	723 958 €	- €	- €	- €
Place Cassine	150 219 €	75,0%	37 555 €	0,0%	0,0%	25,0%
Eplanade	270 143 €	75,0%	67 536 €	- €	- €	25,0%
Parc Cassine	2 189 604 €	75,0%	547 401 €	- €	- €	25,0%
Zone humide	385 510 €	100,0%	- €	- €	- €	0,0%
Place Dr Vernier	341 804 €	75,0%	85 451 €	- €	- €	25,0%
Place Rotonde	442 201 €	75,0%	110 550 €	- €	- €	25,0%
Place Boisse	844 386 €	75,0%	211 096 €	- €	- €	25,0%
Chantemerle	223 395 €	100,0%	- €	- €	- €	0,0%
VRU	1 761 940 €	75,0%	440 485 €	220 243 €	- €	12,5%
TOTAL H.T.	7 711 174 €	71,2%	2 224 032 €	220 243 €	- €	16,6%
				1,8%	220 243 €	

ZAC CASSINE

HYPOTHESES DE PARTICIPATIONS POUR LES RESEAUX EU-AEP-EP

EAUX USEES	
CASSINE	
Secteurs A / C : 100% aménageur	
Secteur E : 100% agglo (reprise du réseau en état dégradé)	
Secteur F : 100% agglo (reprise du réseau unitaire en état dégradé)	
Secteur G : 50% aménageur et 50% agglo / 6 branchements neufs comptabilisés dans part aménageur sur la base d'un ratio de 2 280 € H.T. par branchement	
Secteurs H / I / K : 50% aménageur (dévoilement) et 50% agglo (renouvellement) / 2 branchements neufs pour le secteur H, 1 pour le secteur I et 2 pour le secteur K comptabilisés dans part aménageur sur la base d'un ratio de 2 280 € H.T. par branchement	
CHANTEMERLE	
Secteur L : 100% aménageur	
EAU POTABLE	
CASSINE	
Secteurs A / C : 100% aménageur	
Secteur E : RAS	
Secteur F : 100% agglo (reprise de la conduite)	
Secteur G : 100% aménageur / 6 branchements neufs comptabilisés dans part aménageur sur la base d'un ratio de 1 260 € H.T. par branchement	
Secteurs H / I / K : 50% aménageur (dévoilement) et 50% agglo (renouvellement) / 2 branchements neufs pour le secteur H, 1 pour le secteur I et 2 pour le secteur K comptabilisés dans part aménageur sur la base d'un ratio de 1 260 € H.T. par branchement	
CHANTEMERLE	
Secteur L : 100% aménageur	
EAUX PLUVIALES	
CASSINE	
Proratisation en fonction des surfaces contributives au dimensionnement des ouvrages (cf page suivante) :	
- Surfaces des lots à bâtir : 100% aménageur	
- Secteur non communautaire : 100% aménageur	
- Secteur communautaire : application du taux moyen de prise en charge des aménagements en secteur communautaire hors EU-AEP-EP de l'aménageur, le reste étant réparti à 50 % ville et 50% agglo	
Secteurs spécifiques :	
- Secteur F : réseau structurant 100% agglo (mise en séparatif pluvial)	
- Secteur E (gare routière) : prise en charge à définir	
CHANTEMERLE	
Secteur L : 100% aménageur	

ZAC CASSINE

HYPOTHESES DE PARTICIPATION POUR LES RESEAUX EP

Catégorie		Secteur	Surface contributive	Affectation								
				Surface	Anéageur	Agglo voirie	Agglo cycles	Ville				
Communautaire Non	Communautaire	Cours diagonal	oui	6314 67,6%	4269 14,8%	934 1,4%	88 16,2%	1022				
		Place Cassine	oui	582 100,0%	582 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		Parc Cassine	oui	1999 100,0%	1999 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		Zone humide	oui	2287 100,0%	2287 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
Communautaire Non	Communautaire	Cours diagonal	oui	6244 67,6%	4222 14,8%	924 1,4%	87 16,2%	1011				
		Place Dr Vernier	oui	1440 100,0%	1440 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		Parc Cassine	oui	8644 100,0%	8644 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		Relais P+M	oui	6333 67,6%	4282 14,8%	937 1,4%	88 16,2%	1023				
Communautaire Non	Communautaire	Gare routière	oui	2279 100,0%	2279 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		Chemin Cassine	oui	6073 67,6%	4106 14,8%	899 1,4%	85 16,2%	983				
		Dr Vernier	oui	4953 67,6%	3349 14,8%	733 1,4%	69 16,2%	802				
		Eplanade	oui	1875 100,0%	1875 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
Communautaire Non	Communautaire	Rotonde	oui	4766 67,6%	3223 14,8%	705 1,4%	66 16,2%	772				
		VRIU	oui	4774 100,0%	4774 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		Initial Rentokil	oui	3954 67,6%	2701 14,8%	591 1,4%	56 16,2%	647				
		Place Boisse	oui	2417 100,0%	2417 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
Communautaire Non	Communautaire	Avenue Pellerin	oui	3432 67,6%	2354 14,8%	515 1,4%	49 16,2%	564				
		VRIU	oui	3442 100,0%	3442 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		Rotonde	oui	4478 67,6%	3028 14,8%	663 1,4%	62 16,2%	725				
		Place Rotonde	oui	2598 100,0%	2598 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
Communautaire Non	Communautaire	Chantierie	non	19736								
		T1	oui	1632 100,0%	1632 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		T2	oui	4534 100,0%	4534 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		T3	oui	6633 100,0%	6633 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
Communautaire Non	Communautaire	A1	non	3435								
		A2.1	oui	2758 100,0%	2758 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		A2.2	oui	1160 100,0%	1160 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		A3	oui	2158 100,0%	2158 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
Communautaire Non	Communautaire	A4	oui	1890 100,0%	1890 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		A5	oui	3072 100,0%	3072 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		V1	oui	1179 100,0%	1179 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		V2	oui	3147 100,0%	3147 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
Communautaire Non	Communautaire	V3.1	oui	1973 100,0%	1973 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		V3.2	oui	5188 100,0%	5188 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		V4.1	oui	4680 100,0%	4680 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		V5	oui	4304 100,0%	4304 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
Communautaire Non	Communautaire	V6	oui	1983 100,0%	1983 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		V7	oui	1814 100,0%	1814 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0				
		V8	non	1880								
		C1	non	4516								
Communautaire Non	Communautaire	C2	non	1289								
		C3	non	856								
		C4	non	9536								
		C5	non	2011								
Communautaire Non	Communautaire	C6	non	2087								
		C7	non	992								
		C8	non	1635								
		C9	non	2015								
Communautaire Non	Communautaire	C10	non	2297								
		Initial Rentokil	non									
		H	non	1114								
		Evolution	non	1952								
SURFACE CONTRIBUTIVE				127079	88,1%	111977	5,4%	6900	0,5%	850	5,9%	7551

ZAC CASSINE

MONTANT DES PARTICIPATIONS POUR LES RESEAUX EU-AEP-EP

EU	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.	Reste à charge autres collectivités H.T.	Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.	Participation Grand Chambéry - cycles H.T.	Participation Grand Chambéry - SDE H.T.	Participation ville de Chambéry H.T.
Cassine	762 365 €	56,9%	433 814 €	43,1%	328 551 €	43,1%	328 551 €
Chantemerle	51 714 €	100,0%	51 714 €	0,0%	- €	0,0%	- €
TOTAL H.T.	814 079 €	59,6%	485 528 €	40,4%	328 551 €	40,4%	328 551 €
				40,4%	328 551 €		

AEP	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.	Reste à charge autres collectivités H.T.	Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.	Participation Grand Chambéry - cycles H.T.	Participation Grand Chambéry - SDE H.T.	Participation ville de Chambéry H.T.
Cassine	412 509 €	67,8%	279 866 €	32,2%	132 642 €	32,2%	132 642 €
Chantemerle	59 878 €	100,0%	59 878 €	0,0%	- €	0,0%	- €
TOTAL H.T.	472 387 €	71,9%	339 745 €	28,1%	132 642 €	28,1%	132 642 €
				28,1%	132 642 €		

EP	Montant total	Reste à charge aménageur H.T.	Reste à charge autres collectivités H.T.	Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.	Participation Grand Chambéry - cycles H.T.	Participation Grand Chambéry - SDE H.T.	Participation ville de Chambéry H.T.
Redlus P+M	196 607 €	88,1%	173 242 €	11,9%	23 364 €	0,0%	11 682 €
Dr Vernier	101 920 €	88,1%	89 808 €	11,9%	12 112 €	0,0%	6 056 €
Cours diagonal	546 203 €	88,1%	481 294 €	11,9%	64 909 €	0,0%	32 454 €
Rotonde	356 778 €	88,1%	314 380 €	11,9%	42 398 €	0,0%	21 199 €
Initial Rentokil	390 923 €	88,1%	344 467 €	11,9%	46 456 €	0,0%	23 228 €
Av Pellerin	77 804 €	88,1%	68 558 €	11,9%	9 246 €	0,0%	4 623 €
Place Cassine	26 136 €	88,1%	23 030 €	11,9%	3 106 €	0,0%	1 553 €
Esplanade	- €	88,1%	- €	11,9%	- €	0,0%	- €
Parc Cassine	234 911 €	88,1%	206 995 €	11,9%	27 916 €	0,0%	13 958 €
Zone humide	- €	88,1%	- €	11,9%	- €	0,0%	- €
Place Dr Vernier	48 047 €	88,1%	42 337 €	11,9%	5 710 €	0,0%	2 855 €
Place Rotonde	70 035 €	88,1%	61 712 €	11,9%	8 323 €	0,0%	4 161 €
Place Boisse	17 023 €	88,1%	15 000 €	11,9%	2 023 €	0,0%	1 011 €
VRU	90 807 €	88,1%	80 016 €	11,9%	10 791 €	0,0%	5 396 €
Chemin Cassine (hors mise en séparatif)	51 438 €	88,1%	45 325 €	11,9%	6 113 €	0,0%	3 056 €
Chemin Cassine (mise en séparatif)	284 373 €	0,0%	- €	0,0%	284 373 €	100,0%	- €
Gare routière	54 218 €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €
Chantemerle	272 456 €	100,0%	272 456 €	0,0%	- €	0,0%	- €
TOTAL H.T.	2 819 677 €	78,7%	2 218 620 €	21,3%	601 057 €	10,1%	131 233 €
				14,7%	415 606 €		

ZAC CASSINE

MONTANT TOTAL DES PARTICIPATIONS ET COMPARAISON AVP2019

AVP2023	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.		Reste à charge autres collectivités H.T.		Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.		Participation Grand Chambéry - cycles H.T.		Participation Grand Chambéry - SDE H.T.		Participation ville de Chambéry H.T.		Restant à affecter (gare routière hors options) H.T.	
Secteur communautaire (hors AEP-EU-EP)	12 392 972 €	67,6%	8 379 971 €	32,4%	4 013 001 €	13,0%	1 615 224 €	1,2%	152 265 €	0,0%	- €	18,1%	2 245 512 €	0,0%	- €
Secteur non communautaire (hors AEP-EU-EP)	7 711 174 €	71,2%	5 487 142 €	28,8%	2 224 032 €	2,9%	220 243 €	0,0%	- €	0,0%	- €	16,6%	1 279 832 €	9,4%	723 958 €
EU	814 079 €	59,6%	485 528 €	40,4%	328 551 €	0,0%	- €	0,0%	- €	40,4%	328 551 €	0,0%	- €	0,0%	- €
AEP	472 387 €	71,9%	339 745 €	28,1%	132 642 €	0,0%	- €	0,0%	- €	28,1%	132 642 €	0,0%	- €	0,0%	- €
EP	2 819 677 €	78,7%	2 218 620 €	21,3%	601 057 €	4,3%	119 928 €	0,4%	11 305 €	10,1%	284 373 €	4,7%	131 233 €	1,9%	54 218 €
TOTAL H.T.	24 210 289 €	69,9%	16 911 006 €	30,1%	7 299 284 €	8,1%	1 955 394 €	0,7%	163 571 €	3,1%	745 567 €	15,1%	3 656 577 €	3,2%	778 175 €
						11,8%	2 864 531 €								

AVP2023	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.	Reste à charge autres collectivités H.T.	Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.	Participation Grand Chambéry - cycles H.T.	Participation Grand Chambéry - SDE H.T.	Participation ville de Chambéry H.T.	Restant à affecter (gare routière hors options) H.T.
TRAVAUX	24 210 289 €	69,9%	16 911 006 €	30,1%	7 299 284 €	11,8%	3 656 577 €	3,2%
ETUDES (8% TVX)	1 936 823 €	69,9%	1 352 880 €	30,1%	583 943 €	11,8%	292 526 €	3,2%
TOTAL PAR MOA H.T.	26 147 113 €	69,9%	18 263 886 €	30,1%	7 883 226 €	11,8%	3 949 103 €	3,5%

AVP2019	Montant total H.T.	Reste à charge aménageur H.T.	Reste à charge autres collectivités H.T.	Participation Grand Chambéry - Voirie H.T.	Participation Grand Chambéry - cycles H.T.	Participation Grand Chambéry - SDE H.T.	Participation ville de Chambéry H.T.	Participation gestionnaire VRU H.T.	
TRAVAUX	24 839 714 €	59,2%	14 711 325 €	40,8%	10 128 389 €	12,0%	4 597 396 €	10,3%	2 557 939 €
ETUDES (8% TVX)	1 987 177 €	59,2%	1 176 906 €	40,8%	810 271 €	12,0%	367 792 €	10,3%	204 635 €
TOTAL PAR MOA H.T.	26 826 891 €	59,2%	15 888 231 €	40,8%	10 938 660 €	12,0%	4 965 188 €	10,3%	2 762 574 €

Annexe 3 – Programme des équipements publics de la phase 1 de la ZAC



Annexe 4 – Clés de répartition de la phase 1 de la ZAC

Montant Travaux		Travaux secteur communaliste (hors ASP-EU-EP)					Travaux EP - Répartition en fonction des surfaces contributives au dimensionnement des ouvrages (hors services publics)					Travaux EU - Répartition selon secteur hors éléments structuraux					Travaux ASP - Répartition selon secteur hors éléments structuraux					
		Ville	Agglo - Voie	Agglo - Cycles	CGE	Total EP	Ville	Agglo - Voie	Agglo - Cycles	CGE	Total EU	Ville	Agglo - Voie	Agglo - Cycles	Agglo - SDE	CGE	Total ASP	Ville	Agglo - Voie	Agglo - Cycles	Agglo - SDE	CGE
Cours diagonal	Ré. Je		16,9%	10,30%	71,13%			5,43%	0,51%	88,13%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Total	3 432 055,98 €	2 771 481,10 €	488 931,22 €	282 489,91 €	48 500,57 €	412 812,70 €	22 958,73 €	21 563,34 €	372 945,55 €	128 173,71 €	3,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	109 608,07 €	128 173,71 €	3,73%	0,00%	0,00%	100,00%
	%	100,00%	80,75%	13,68%	8,34%	1,41%	57,49%	0,67%	0,73%	10,86%	3,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Parc Cassine	Ré. Je		25,00%	0,00%	75,00%			5,43%	0,51%	88,13%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Total	1 188 470,27 €	867 448,48 €	241 882,12 €	183 402,12 €	725 586,38 €	10 897,65 €	9 895,89 €	915,88 €	161 668,22 €	28 952,88 €	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8 607,29 €	28 952,88 €	2,44%	0,00%	0,00%	100,00%
	%	100,00%	81,40%	20,33%	61,00%	15,44%	0,84%	0,83%	0,08%	13,60%	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Zone humide	Ré. Je		0,00%	0,00%	100,00%			5,43%	0,11%	88,13%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Total	434 724,89 €	434 724,89 €	- €	- €	434 724,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00%
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Place Cassine	Ré. Je		25,00%	0,00%	75,00%			5,43%	0,51%	88,13%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Total	173 072,64 €	167 315,44 €	- €	- €	125 866,58 €	5 793,20 €	342 04 €	293,7 €	5 074,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00%
	%	100,00%	96,67%	24,13%	0,00%	72,50%	3,33%	0,00%	0,00%	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Place docteur Vernier	Ré. Je		25,00%	0,00%	75,00%			5,43%	0,51%	88,13%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Total	322 607,90 €	146 384,23 €	36 091,06 €	- €	108 273,17 €	87 389,08 €	5 190,91 €	4 742,23 €	77 807,23 €	60 486,61 €	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30 398,02 €	60 486,61 €	0,14%	0,00%	0,00%	100,00%
	%	100,00%	44,75%	11,09%	0,00%	33,60%	27,09%	1,61%	1,41%	23,87%	18,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,42%	18,76%	0,00%	0,00%	0,00%	9,42%

Réf. Je	Montant travaux	Participations			
		Ville de Chambéry	Grand Chambéry - Voie	Grand Chambéry - Cycles	CGE
Cours diagonal	Total travaux	484 066,29 €	305 647,76 €	50 855,91 €	2 581 705,01 €
	Total travaux + études (8%)	513 770,09 €	330 095,58 €	54 793,47 €	2 788 241,41 €
	%	100,00%	8,91%	1,48%	75,22%
	Total travaux	1 188 470,27 €	252 759,77 €	935,66 €	924 813,35 €
Parc Cassine	Total travaux + études (8%)	1 283 544,43 €	10 758,95 €	1 010,51 €	998 780,42 €
	%	100,00%	21,27%	0,08%	77,82%
	Total travaux	434 724,89 €	- €	- €	434 724,89 €
	Total travaux + études (8%)	469 502,89 €	- €	- €	469 502,89 €
Place Cassine	Total travaux	173 072,64 €	315,87 €	79,37 €	180 560,70 €
	Total travaux + études (8%)	186 915,53 €	45 944,57 €	31,72 €	141 005,56 €
	%	100,00%	24,37%	0,02%	75,44%
	Total travaux	322 607,90 €	4 742,23 €	445,84 €	276 135,02 €
Place docteur Vernier	Total travaux + études (8%)	348 416,53 €	49 884,93 €	483,34 €	288 215,83 €
	%	100,00%	12,80%	0,14%	85,59%

Réf. Je	Montant travaux	Participations			
		Ville de Chambéry	Grand Chambéry - Voie	Grand Chambéry - Cycles	CGE
Dépollution PPC	Total travaux	138 204,47 €	23 384,20 €	14 096,86 €	98 304,84 €
	Total travaux + études (8%)	148 273,84 €	25 265,91 €	15 265,91 €	108 741,02 €
	%	100,00%	16,9%	10,30%	77,13%
	Total travaux	1 188 470,27 €	241 882,12 €	133 402,12 €	813 186,03 €

Réf. Je	Montant travaux	Participations			
		Ville de Chambéry	Grand Chambéry - Voie	Grand Chambéry - Cycles	CGE
Dépollution PPC	Total travaux	1 188 470,27 €	241 882,12 €	133 402,12 €	813 186,03 €
	Total travaux + études (8%)	1 283 544,43 €	10 758,95 €	1 010,51 €	998 780,42 €
	%	100,00%	18,76%	1,35%	72,01%
	Total travaux	434 724,89 €	- €	- €	434 724,89 €
